


Rollstuhlrampentauglichkeit von Straßenbahnhaltestellen


Sachstandsbericht über das Umbauprogramm im
Behindertenbeirat am Dienstag, 17.11.2020 über „Jitsi“




Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit

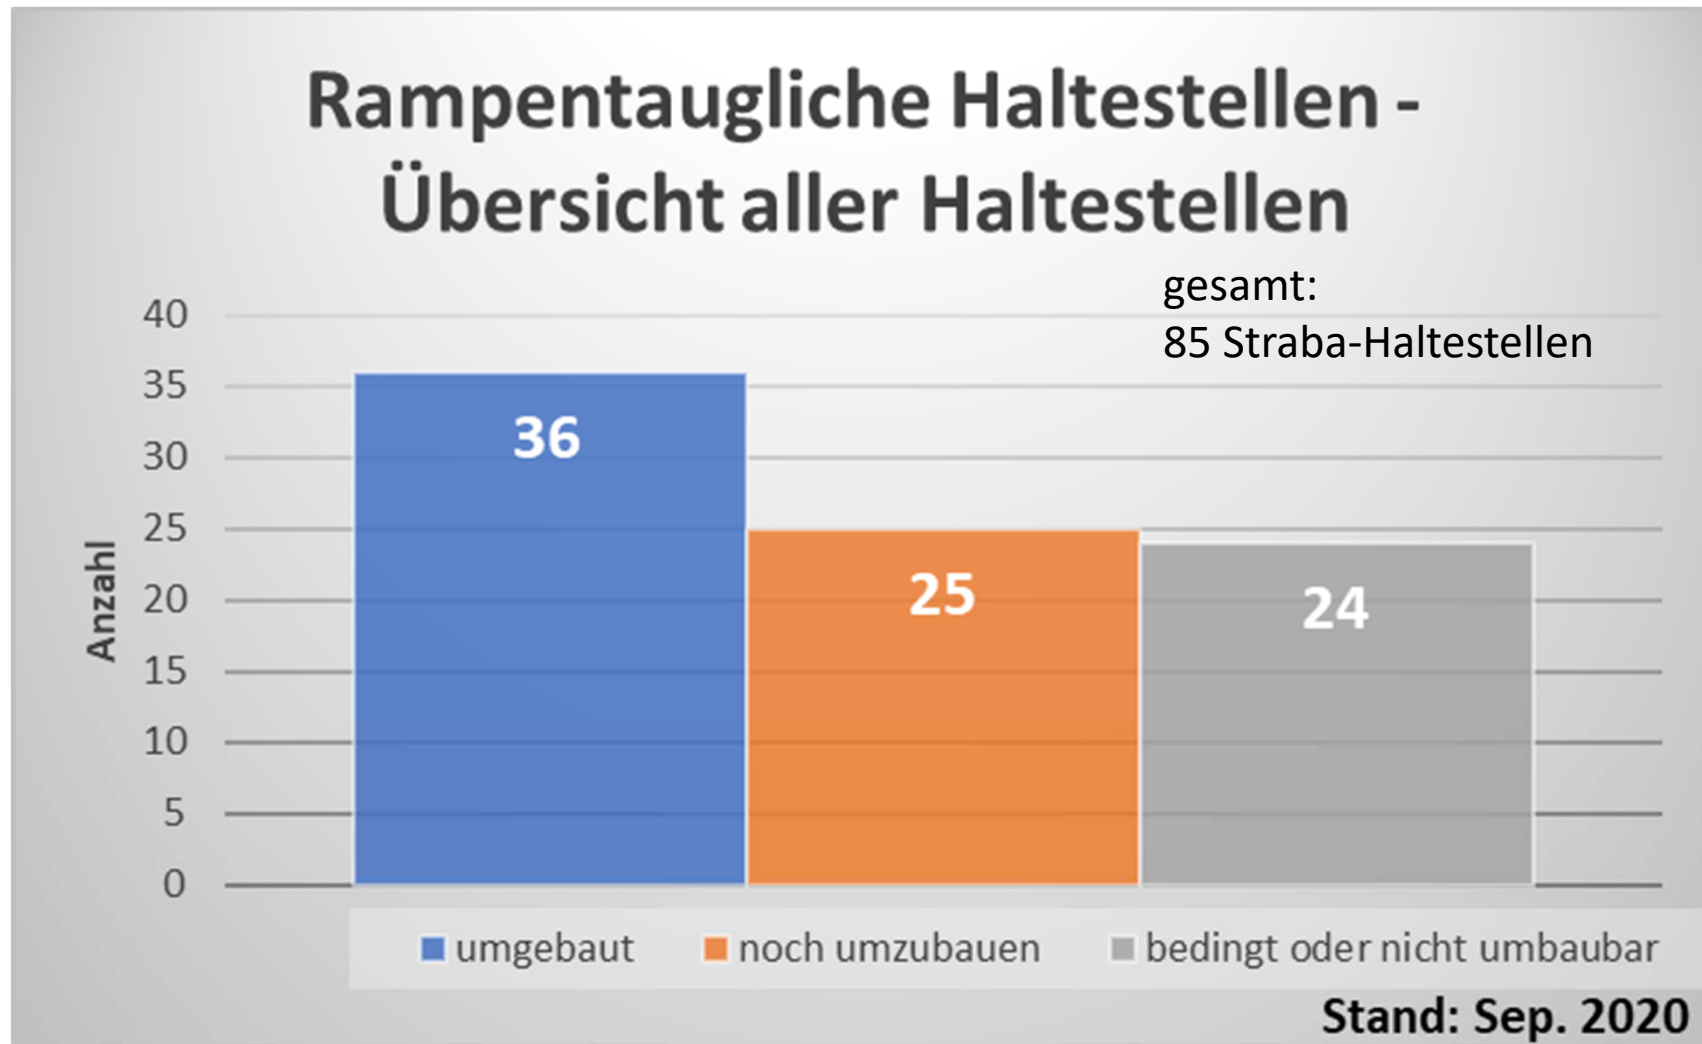

Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit

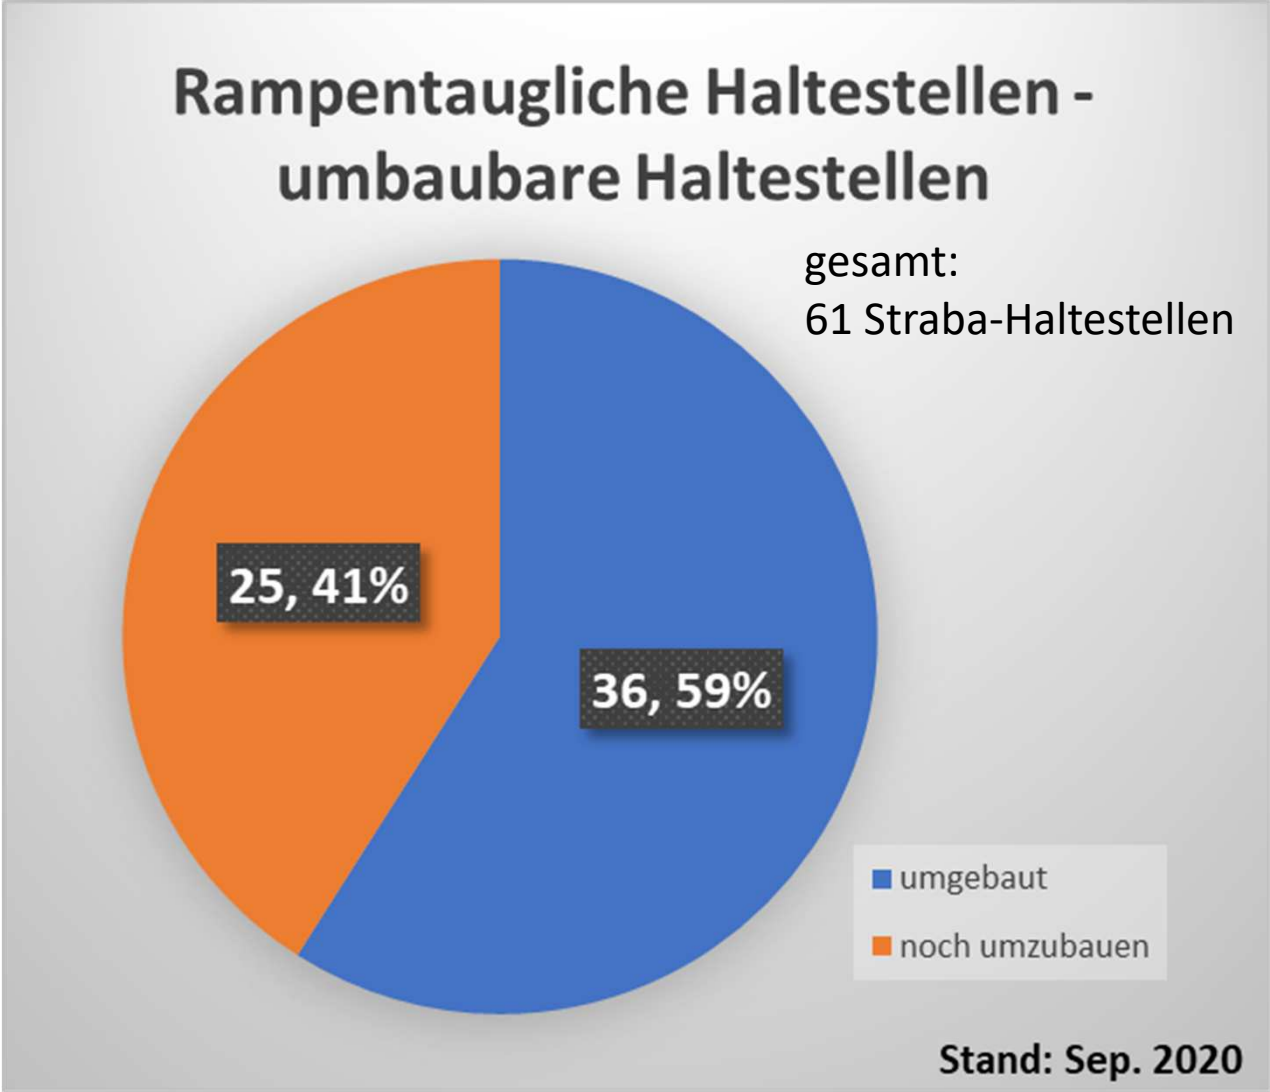

Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit

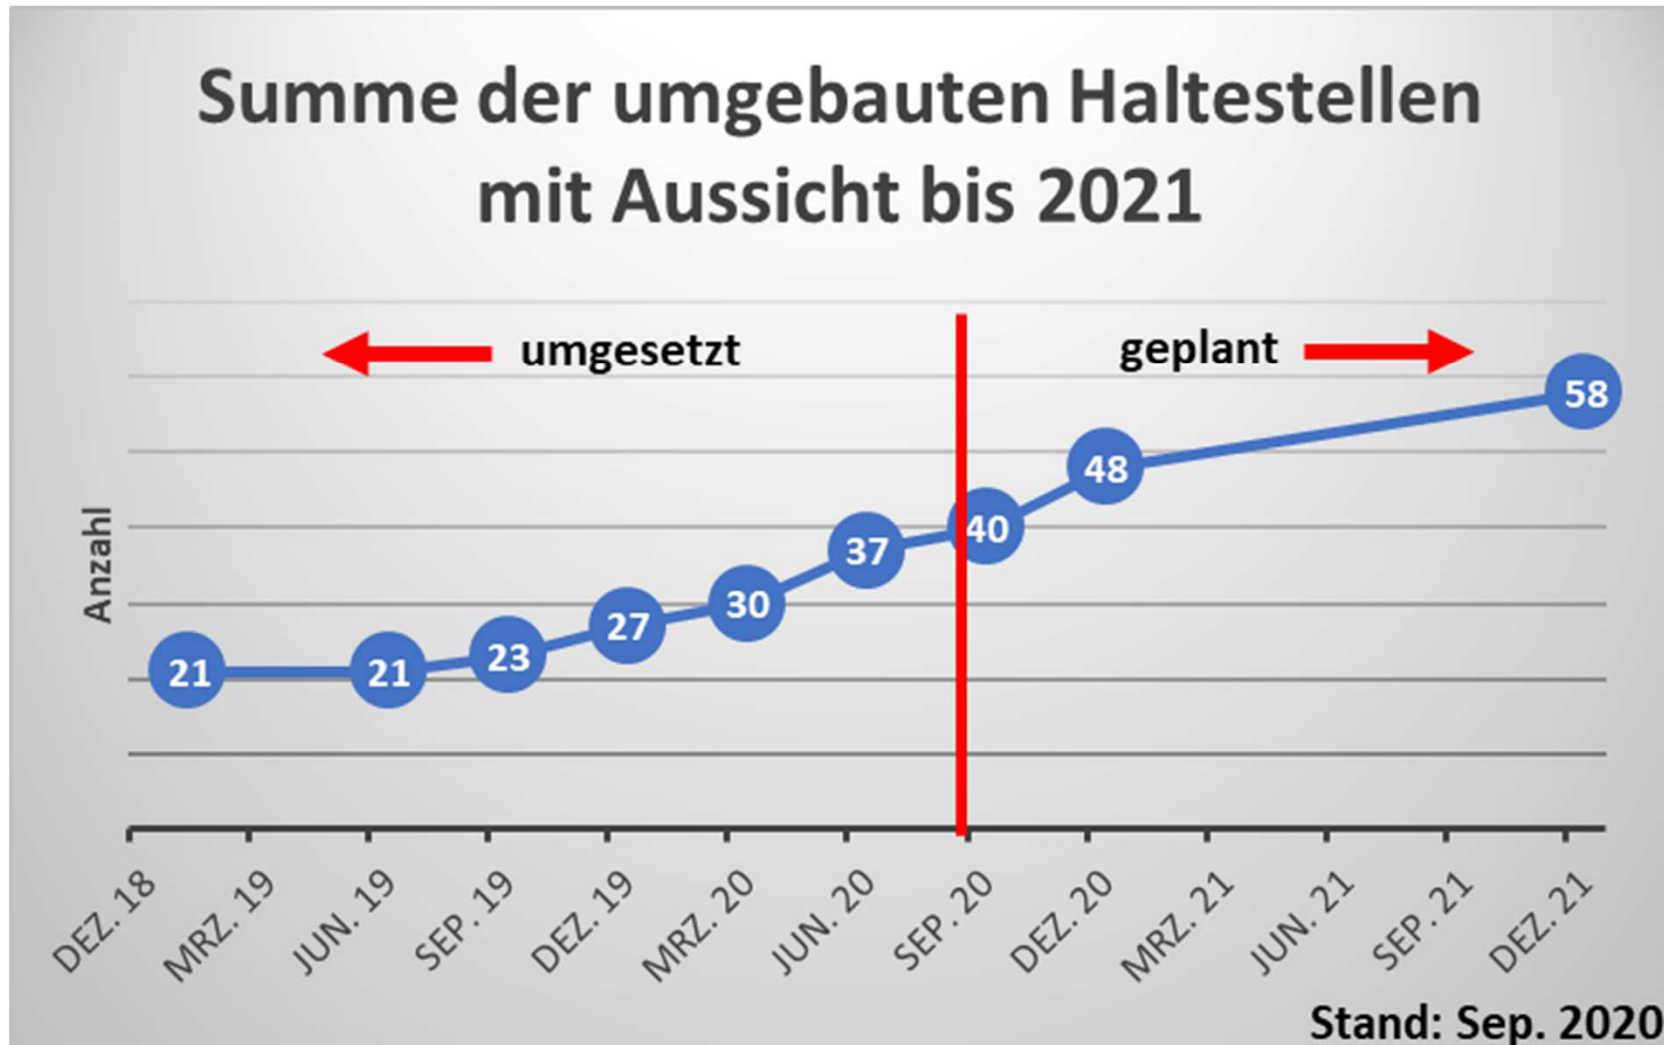

Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit



Bereits rampentaugliche Haltestellen

Berner Straße (stad**tauswärts**)

Brücknerstraße

Dallenbergbad (**beidseitig**)

Dom (stad**tauswärts**)

Eehaltenhaus (stad**teinwärts**)

Fechenbachstraße (stad**tauswärts**)

Felix-Fechenbach-Haus

HBF-West

Juliuspromenade A-F (komplett)

Madriker Ring (stad**tauswärts**)

Nautiland (stad**teinwärts**)

Sanderring (stad**teinwärts**)

Steinbachtal (**beidseitig**)

Ulmer Hof (stad**tauswärts**)



Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit



Umgebaute Haltestellen 2019

Athener Ring

Brombergweg (stadtauswärts)

Brombergweg (stadteinwärts)

DJK Sportzentrum (stadtauswärts)

DJK Sportzentrum (stadteinwärts)

Wiener Ring (stadtauswärts)



Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit



Umgebaute Haltestellen 2020

Haltestelle	Wann	Prio BHB
Bürgerbräu	1. Q 2020	/
Nautiland (stadtauswärts)		1
Pestalozzistraße		2
Rathaus (stadtauswärts)	2. Q 2020	1
Reuterstraße (stadtauswärts)		1
Neubaustraße (stadtauswärts)		1
Ruderzentrum (stadteinwärts)		2
Berner Straße (stadteinwärts)		1
Talavera (stadteinwärts)	3. Q 2020	1
Rathaus (stadteinwärts)	4. Q 2020	1



Haltestellen-Umbauprogramm zur Rollstuhlrampentauglichkeit



Umzubauende Haltestellen 2020

Haltestelle	Wann	Bemerkung	Prio BHB
Ehehaltenhaus (stadtauswärts)	2. Q 2020	Geländer beim Pulverbeschichten	1
Uni Klinikum Bereich D	3. Q 2020	Umbau Beginn Oktober	1
Eichendorffstraße (stadteinwärts)	4. Q 2020		1
Neubaustraße (stadteinwärts)		Wartehalle Anfang Nov. gefertigt	1
Max-Mengeringhausen-Straße (beidseitig)		Wartehalle beim Pulverbeschichten	2
Rottenbauer		Wartehalle beim Pulverbeschichten	2
Straßburger Ring (beidseitig)		Umbau Beginn Oktober Dauer ca. 20 Wochen	2
Ulmer Hof (stadteinwärts)		Wartehalle Anfang Nov. gefertigt	1



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

